



**DESMINADO HUMANITARIO
IMPLEMENTACIÓN DEL ARTICULO 5°**



24 FEBRERO 2009




**DESMINADO HUMANITARIO
IMPLEMENTACIÓN DEL ARTICULO 5°**

- NUEVA APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL DESMINADO**
- Compromisos internacionales vigentes. (Ottawa)
 - El avance del desminado a la fecha.
 - La falta de Unidades de certificación.
 - La necesidad y posibilidad de abrir otros frentes de trabajo.
 - El presupuesto nacional asignado a la fecha.
 - Los apoyos en presupuesto y maquinaria recibidos por el país.

**Nuevo Plan de Desminado Nacional
2008 al 2016.**

24 FEBRERO 2009

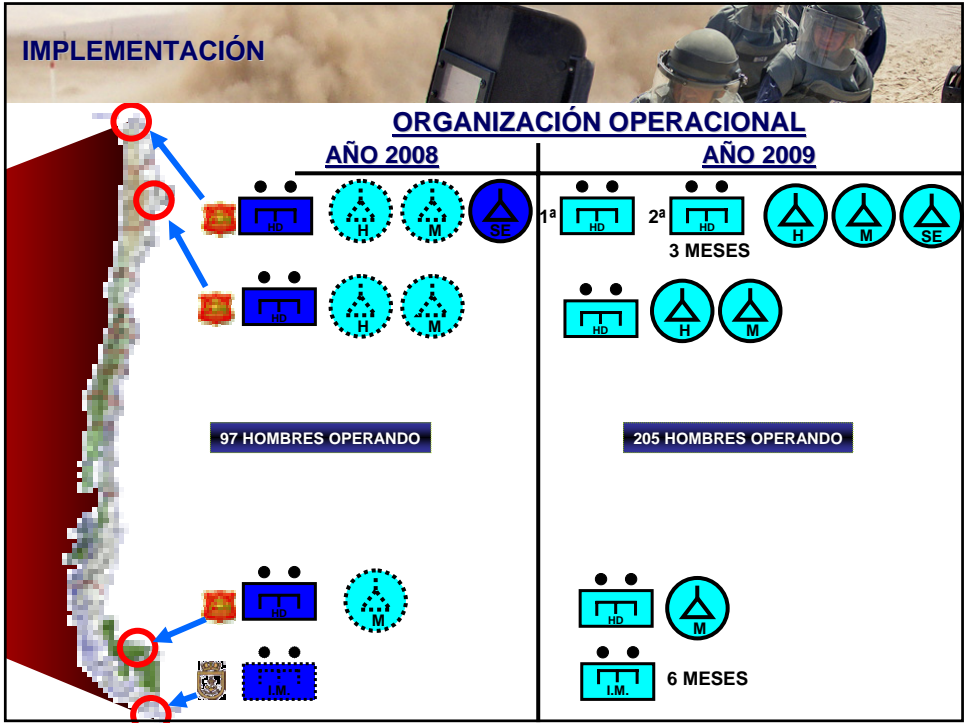

SECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

2/1/5/2/1/10

- ARICA
- ANTOFAGASTA
- PUNTA ARENAS

- ARICA
- ANTOFAGASTA

CERTIFICACIÓN

LA CERTIFICACIÓN PERMITE IR CERRANDO LOS PROCESOS DE DESMINADO E IR ENTREGANDO LOS TERRENOS LIBRES DE MINAS A SUS DUEÑOS

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESPECIALES AÑO 2008

MONEDA	ASIGNACIÓN
DOLAR	US\$ 10.600.000,00

CANT.	NOMBRE DEL POR ADQUIRIR		
2	Máquinas de desminado pesadas MINEWOLF ALEMANIA	✓	US\$ 4.116.170
3	Máquinas de desminado medianas BOZENA 5 ESLOVAQUIA	✓	US\$ 3.327.639
3	Camiones taller 6 x 6 con Grúa ACTROS 3344 MERCEDES BENZ	✓	US\$ 1.081.038
8	Camiones 4 x 4 Multipropósito ATEGO 1725 MERCEDES BENZ	✓	US\$ 1.188.096
5	Ambulancias 4 x 4 FORD F350 A BERTONATI	✓	US\$ 592.025
5	Camionetas doble cabina 4 x 4 NISSAN NAVARA A MARUBENI	✓	US\$ 166.480
1	Minibus		
		TOTAL EMPLEADO A LA FEHA	US\$ 10.471.448
		SALDO	US\$ 128.552

OPERACIONES DE DESMINADO AÑO 2008

AVANCES DE DESMINADO A DICIEMBRE 2008

COMUNA	MF		MF		TAREA
	Cantidad campos minados año 2002	Cantidad de minas A.P. año 2002	Campos minados levantados 01.01.2009	Minas A.P. levantadas	Minas A.P. que faltan por levantar
ARICA - PARINACOTA	95	89.272	11	10.814	78.458 (84)
TARAPACÁ	7	1.136	1	124	1.012 (6)
ANTOFAGASTA	52	23.896	16	8.564	15.332 (36)
VALPARAISO	1	123	1	123	(-)
MAGALLANES	28	8.490	2	1.608	6.882 (26)
Áreas de Peligro	15	504	--	--	504 (15)
TOTAL	198	123.421	31	21.233	102.188 (167)
ESTADO DE AVANCE			15,65 %	17,20 %	82,80 %

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

RECURSOS ASIGNADOS POR PRESUPUESTO AÑO 2009

FUNCIONAMIENTO

ITEM	MONEDA	ASIGNACIÓN
1	NACIONAL	\$ 76.069.792
2	EXTRANJERA	US\$ 95.203,37

OPERACIONES

ITEM	NOMBRE DEL ITEM	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA
1	DESMINADO REGIÓN DE ARICA – PARINACOTA	\$ 755.869.456	US \$ --	US \$ 1.453.595,11
2	DESMINADO REGIÓN DE ANTOFAGASTA	\$ 518.465.943	US \$ --	US \$ 997.049,89
3	DESMINADO REGIÓN DE MAGALLANES	\$ 1.044.524.828	US \$ --	US \$ 2.008.701,59
4	CAPACITACIÓN NACIONAL Y EDUC. CIVIL	\$ 98.758.655	US \$ 144.400,00	US \$ 334.320,49
		\$ 2.417.618.882	US \$ 144.400,00	US \$ 4.793.667,08

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA



ASIGNACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS A PARTIR DEL AÑO 2004

APORTES INTERNACIONALES		APORTE NACIONAL	
PAÍS U ORGANIZACIÓN	MONTO US\$	AÑO	MONTO US\$
O.E.A.	US \$ 151.242,00	AÑO 2004	484.086,20
CANADÁ	US \$ 254.378,13	AÑO 2005	680.217,24
PAÍSES BAJOS	US \$ 190.363,43	AÑO 2006	1.391.196,00
EE.UU.	US \$ 223.552,67	AÑO 2007	1.358.632,18
SUIZA	US \$ 50.000,00	AÑO 2008	4.186.695,98
GICHD	US \$ 50.000,00	AÑO 2008	10.600.000,00
U.E.	US \$ 1.192.700,00	AÑO 2009	4.793.667,00
ALEMANIA	US \$ 63.305,76		
ITALIA	US \$ 121.614,56		
O.E.A.	US \$ 103.136,13		
TOTAL	US\$ 2.444.042,68		US\$ 23.494.494,60

NOTA: Este monto no considera los gastos efectuados por las FF.AA.

9,4 %

90,6 %



OPERACIONES DE DESMINADO

➤ En Ejecución


- Levantamiento manual de Campos Minados de Chapiquiña y mecanizado en quebrada Escritos. (Unidad de Arica)
- Levantamiento de Campos Minados de Cori (Unidad de Calama).
- Levantamiento de 2 Campos Minados de Bahía Azul. (Unidad de Punta Arenas)
- Instalación de campamento sobre Isla Hornos. (Ejecutado por Unidad de la Armada)
- Recepción y Distribución de 11 Camiones, 9 Carros, 2 Generadores sobre carro, 5 Ambulancias, 5 camionetas Nissan Navara.
- Licitación de Helicóptero para Evacuación Aeromédica en Isla de Hornos a partir de la segunda quincena de marzo 2009.
- Licitación de Seguros de Vida para mejorar la cobertura actual de los desminadores e implementación del personal de apoyo.
- Con la POMTA se dio inicio al levantamiento del Campo Minado de Isla Hornos a partir del 15 FEBRERO del 2009.



OPERACIONES DE DESMINADO

➤ Previstas por Ejecutar

- Con la Escuela de Ingenieros iniciar la certificación de Malloco (AP), previsto para ser ejecutado los meses de Marzo – Abril 2009.
- Conformación y completación de las 5 Unidades Mecanizadas de certificación para comenzar su funcionamiento a partir de marzo.
- Compra de dos campamentos de contenedores para habitabilidad de las unidades mecanizadas.
- Creación de la Sección de Desminado Manual en el frente Norte Costero a partir de octubre del 2009.



**DESMINADO HUMANITARIO
IMPLEMENTACIÓN DEL ARTICULO 5°**

¿PREGUNTAS?

- ¿Chile a sometido una solicitud de prórroga bajo Art. 5 ?
- ¿ Chile tiene previsto presentar una solicitud de prórroga ?

24 FEBRERO 2009
